RESERVATÓRIO SP25 | LAGO RECUPERAÇÃO | EXTRAVASOR DE BORDA

Id	EDT	Nome da tarefa	Início	Término
1	**1**	**Reservatóro de Rejeitos SP25 | Lago Recuperação | Extravasor de Borda**	**16/01/18**	**03/03/21**
2	**1.1**	**Engenharia**	**16/01/18**	**08/10/18**
3	1.1.1	Início | | Reservatóro de Rejeitos SP25 | Lago Recuperação | Extravasor de Borda	16/01/18	16/01/18
4	1.1.2	Documentação para Protocolo no Órgão Ambiental	16/01/18	08/10/18
5	**1.2**	**Licenciamento**	**08/10/18**	**16/01/19**
6	1.2.1	ASV | Protocolo no Órgão Ambiental	08/10/18	08/10/18
7	1.2.2	ASV | Análise de Pedido pelo Órgão Ambiental	08/10/18	16/01/19
8	1.2.3	ASV | Obtenção	16/01/19	16/01/19
9	**1.3**	**Suprimentos**	**09/02/18**	**28/02/19**
10	1.3.1	Processos de Suprimentos	09/02/18	28/02/19
11	**1.4**	**Construção**	**01/03/19**	**03/03/21**
12	1.4.1	Mobilização de Pessoal e Equipamentos	01/03/19	02/05/19
13	1.4.2	Construção do Reservatóro de Rejeitos SP25 | Lago Recuperação | Extravasor de Borda	03/05/19	01/02/21
14	1.4.3	Desmobilização de Pessoal e Equipamentos	02/02/21	03/03/21
15	**1.5**	**Conclusão**	**01/02/21**	**01/02/21**
16	1.5.1	Término | Reservatóro de Rejeitos SP25 | Lago Recuperação | Extravasor de Borda	01/02/21	01/02/21

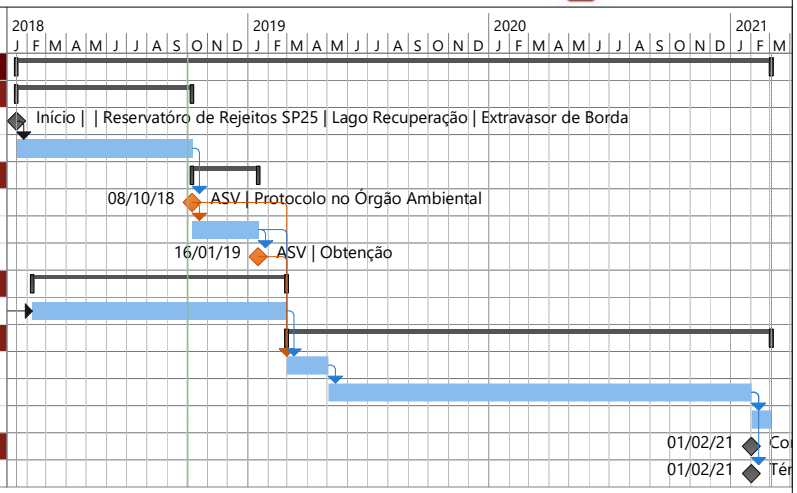

CRONOGRAMA MACRO
CR-REJ03-PL-002_Rev0_Licenciamento

02/10/18
